Quản trị dự án

BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG OPENDAY EDTECH



GVHD: PGS.TS Bùi Thị Thuý Hằng

Nhóm 8

1. Nguyễn Phương Thảo - 20231632
2. Hoàng Thị Thảo - 20231630
3. Hoàng Hoài Thương - 20231636
4. Nguyễn Anh Thư - 202412008
5. Lê Thanh Thảo - 20231631

Mục lục


1 TỔNG QUAN DỰ ÁN

2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

3 TRIỂN KHAI DỰ ÁN

4 GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ

5 KẾT QUẢ

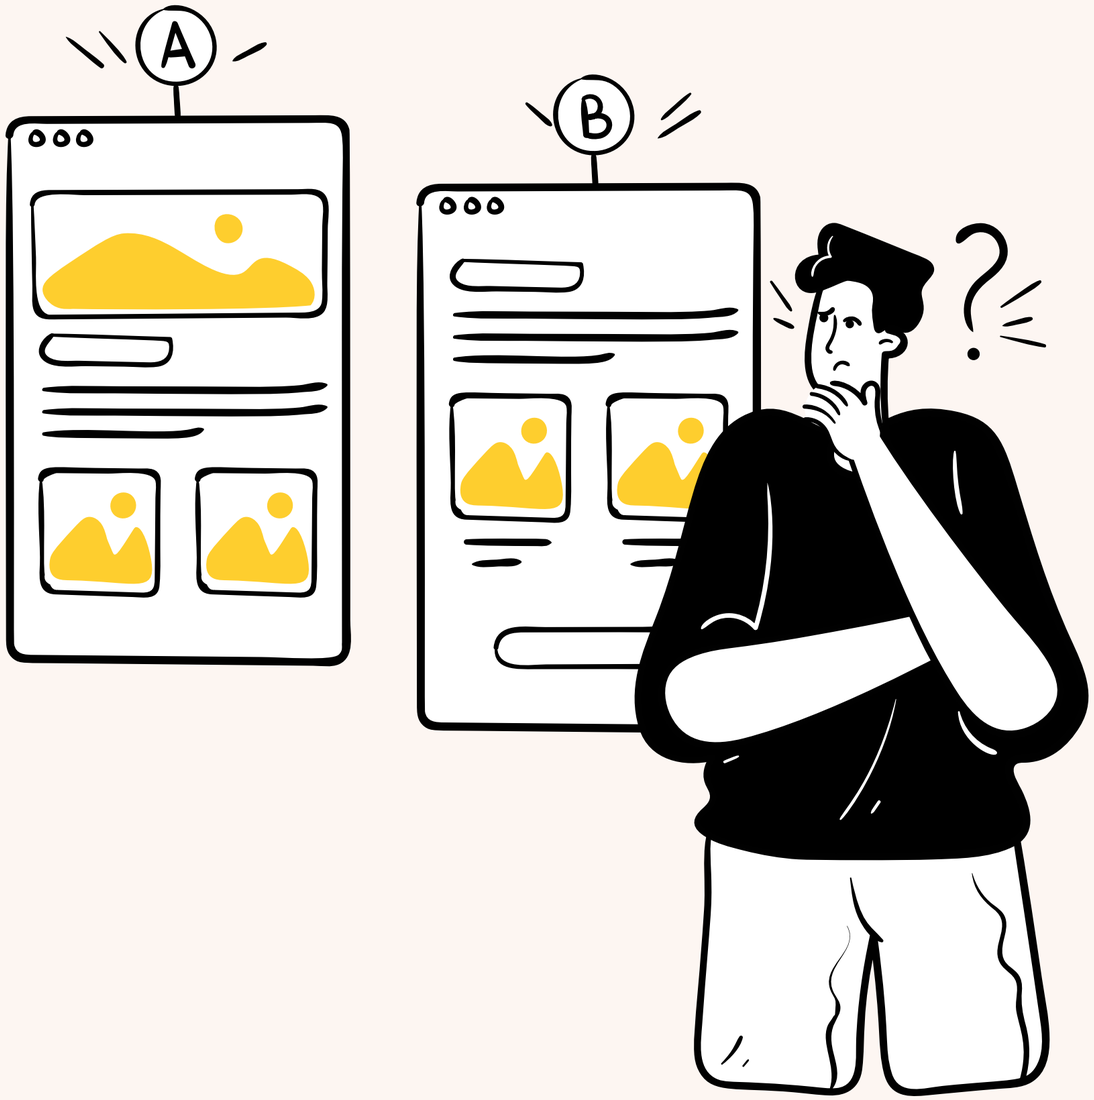

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Vấn đề cốt lõi



NGHIÊN CỨU

- Ngành Công nghệ Giáo dục (EdTech) phát triển mạnh trong kỷ nguyên số và CMCN 4.0.
- Tại Việt Nam, mức độ nhận diện ngành chưa chưa cao.
- Dễ bị nhầm với CNTT, Sư phạm hoặc Thiết kế.
- Nhận thức của học sinh THPT và phụ huynh về ngành vẫn còn một số hạn chế.

VẤN ĐỀ

- Cần nâng cao nhận diện và định vị đúng ngành Công nghệ Giáo dục.
- Chuẩn hóa nội dung truyền thông, làm rõ tính giao thoa Công nghệ – Giáo dục.
- Xây dựng chiến lược truyền thông nhất quán, hiện đại.
- Tăng khả năng tiếp cận đúng nhóm thí sinh mục tiêu.
- Chuyển hóa nhận thức thành hành động (đăng ký OpenDay và xét tuyển).

2. Ma trận đánh giá & Lựa chọn giải pháp chiến lược



Lý do lựa chọn:

1. Chạm đúng hành vi GenZ (Tiktok & Facebook)
2. Trải nghiệm đa nền tảng và chuyên nghiệp (Website & chatbot)
3. Cho phép đo lường dữ liệu



2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Mục tiêu dự án



MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

- Triển khai chiến dịch truyền thông đa nền tảng OpenDay ngành Công nghệ Giáo dục.
- Cung cấp thông tin chính xác về chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp.
- Nâng cao nhận diện và định vị thương hiệu ngành học.
- Thu hút học sinh THPT, phụ huynh quan tâm đến ngành.
- Thúc đẩy đăng ký tham gia OpenDay và tăng số lượng hồ sơ xét tuyển vào ngành.

Mục tiêu cụ thể mô hình SMART

1. Specific (cụ thể)

- Quảng bá và cung cấp thông tin chính thống về ngành ED2



2. Measurable (Đo lường được)

- Mục tiêu đạt các chỉ số trên từng nền tảng

+1K	+2K	+1K	+200
Theo dõi Facebook TikTok	Tiếp cận Facebook Tiktok	Người truy cập website	Lượt đăng ký form

3. Achievable (Tính khả thi)

- Tối ưu hóa nhân sự chuyên trách, năng lực sản xuất nội dung số
- Các giải pháp công nghệ tự động hóa sẵn có của đội ngũ thực hiện dự án.

4. Relevant (Tính thực tế)

- Giải quyết trực tiếp bài toán định hình thương hiệu ngành học, đồng thời thúc đẩy trực tiếp hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh cho sự kiện OpenDay của Khoa.

Mục tiêu cụ thể mô hình SMART

1. Specific (cụ thể)

- Quảng bá và cung cấp thông tin chính thống về ngành ED2



2. Measurable (Đo lường được)

- Mục tiêu đạt các chỉ số trên từng nền tảng

+1K	+2K	+1K	+200
Theo dõi Facebook TikTok	Tiếp cận Facebook Tiktok	Người truy cập website	Lượt đăng ký form

3. Achievable (Tính khả thi)

- Tối ưu hóa nhân sự chuyên trách, năng lực sản xuất nội dung số
- Các giải pháp công nghệ tự động hóa sẵn có của đội ngũ thực hiện dự án.

4. Relevant (Tính thực tế)

- Giải quyết trực tiếp bài toán xóa bỏ định kiến, định hình thương hiệu ngành học, đồng thời thúc đẩy trực tiếp hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh cho sự kiện OpenDay của Khoa.

Mục tiêu cụ thể mô hình SMART

1. Specific (cụ thể)

- Quảng bá và cung cấp thông tin chính thống về ngành ED2

2. Measurable (Đo lường được)

- Mục tiêu đạt các chỉ số trên từng nền tảng

+1K	+2K	+1K	+200
Theo dõi Facebook TikTok	Tiếp cận Facebook Tiktok	Người truy cập website	Lượt đăng ký form

3. Achievable (Tính khả thi)

- Tối ưu hóa nhân sự chuyên trách, năng lực sản xuất nội dung số.
- Các giải pháp công nghệ tự động hóa sẵn có của đội ngũ thực hiện dự án.

4. Relevant (Tính thực tế)

- Giải quyết trực tiếp bài toán định hình thương hiệu ngành học, đồng thời thúc đẩy trực tiếp hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh cho sự kiện OpenDay của Khoa.

Mục tiêu cụ thể mô hình SMART

1. Specific (cụ thể)

- Quảng bá và cung cấp thông tin chính thống về ngành ED2



3. Achievable (Tính khả thi)

- Tối ưu hóa nhân sự chuyên trách, năng lực sản xuất nội dung số
- Các giải pháp công nghệ tự động hóa sẵn có của đội ngũ thực hiện dự án.

3. Measurable (Đo lường được)

- Mục tiêu đạt các chỉ số trên từng nền tảng

+1K	+2K	+1K	+200
Theo dõi Facebook TikTok	Tiếp cận Facebook Tiktok	Người truy cập website	Lượt đăng ký form

4. Relevant (Tính thực tế)

- Giải quyết trực tiếp bài toán định hình thương hiệu ngành học, đồng thời thúc đẩy trực tiếp hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh cho sự kiện OpenDay của Khoa.

Mục tiêu cụ thể mô hình SMART

5. Time-bound (Giới hạn thời gian)

- Hoàn thành chiến dịch.
- Hoàn tất chuẩn bị, triển khai và đánh giá theo đúng tiến độ.
- Triển khai và nghiệm thu chiến dịch đúng thời hạn

THỜI HẠN

6 TUẦN

Người truy cập website



2. Cơ cấu tổ chức dự án

Phân rã tổ chức (OBS) và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí chuyên trách thông qua bảng cơ cấu dưới đây

Vai trò	Thành viên đảm nhiệm	Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính trong dự án
Trưởng dự án	Nguyễn Phương Thảo	Điều phối dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và ngân sách; Phê duyệt nội dung, xử lý vấn đề phát sinh và quản lý rủi ro.
Nhóm Nội dung	Nguyễn Phương Thảo Hoàng Hoài Thương Hoàng Thị Thảo	Nghiên cứu đối tượng, xây dựng nội dung truyền thông và kịch bản chi tiết cho các ấn phẩm video và chuỗi bài đăng định hướng.
Nhóm Thiết kế và sáng tạo ấn phẩm	Nguyễn Anh Thư Hoàng Hoài Thương	Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho sự kiện OpenDay (Key Visual). Thiết kế poster cho bài đăng mạng xã hội. Sản xuất các nội dung video ngắn.
Nhóm Phát triển Website	Lê Thanh Thảo Hoàng Thị Thảo	Thiết kế và phát triển Website, tối ưu trải nghiệm người dùng, đảm bảo vận hành ổn định và xây dựng kịch bản FAQ cho Chatbot.

3. Kế hoạch công việc

Hệ thống công việc thành 4 khối cấu trúc đại diện cho 4 giai đoạn và lĩnh vực chuyên môn then chốt. Dựa trên cấu trúc phân rã (WBS), đảm bảo tính không trùng lặp và không bỏ sót bất kỳ hạng mục nào trong suốt vòng đời dự án.

Cấu trúc phân rã (Work Breakdown Structure – WBS)

1. Nghiên cứu và lập kế hoạch

1.1 Báo cáo phân tích thị trường & đối tượng

1.2 Tài liệu chân dung khách hàng mục tiêu

1.3 Kế hoạch tổng thể chiến dịch (Nhân sự, ngân sách, timeline, rủi ro)

2. Sản xuất nội dung

2.1 Lên ý tưởng

2.1.1 Brainstorm concept
2.1.2 Viết kịch bản video

2.2 Thiết kế

2.2.1 Bài đăng Facebook
2.2.2 Video
2.2.3 Website truyền thông

3. Marketing & Truyền thông

3.1 Social media

3.1.1 Lập lịch đăng bài
3.1.2 Tương tác, trả lời comment

3.2 Seeding và chia sẻ bài đăng

3.2.1 Seeding
3.2.2 Chia sẻ bài đăng

4. Đo lường & Báo cáo

4.1 Báo cáo hiệu quả hàng tuần

4.1.1 Thu thập số liệu
4.1.2 Tổng hợp và so sánh với KPI theo tuần
4.1.3 Đề xuất điều chỉnh

4.2 Báo cáo tổng kết chiến dịch

Mốc thời gian

Giai đoạn 1

10/05 - 17/05

Giai đoạn này tập trung phân tích thị trường và đối tượng quan tâm đến sự kiện, từ đó lập kế hoạch tổng thể chiến dịch “Truyền thông Openday Edtech”.



Giai đoạn 2

18/05 - 08/06

Lên ý tưởng sản suất nội dung concept sự án truyền thông. Tập trung sản suất và phát triển website, ấn phẩm & video quảng bá

Giai đoạn 3

18/05 - 08/06

Lập chiến dịch truyền thông trên các nền tảng, đẩy mạnh tương tác Facebook thông qua seeding và chia sẻ bài đăng

Giai đoạn 4

25/05 - 14/06

Đo lường dữ liệu hàng tuần so sánh chỉ tiêu từ đó đưa ra đề xuất điều chỉnh phù hợp. Tuần cuối triển khai tổng hợp và tổng kết chiến dịch rút ra bài học, cải thiện cho sự kiện tiếp theo

4. Kế hoạch chi tiết tiến độ dự án

DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG OPENDAY
Thời gian triển khai dự kiến: 30 ngày

BIỂU ĐỒ GANTT

thg 5, 2025

Nhóm 8			Tuần	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6
KẾ HOẠCH DỰ ÁN									
GIAI ĐOẠN 1 **Nghiên cứu và lập kế hoạch**			**Ngày**						
A1	**Báo cáo phân tích thị trường & đối tượng**		10/05 – 16/05						
	A1.1	Phân tích thị trường	10/05 - 14/5						
	A1.2	Phân tích đối tượng	10/05 - 14/5						
A2	**Kế hoạch tổng thể chiến dịch**		10/05 – 16/05						
	A2.1	Nhân sự	15/05 - 17/05						
	A2.2	Ngân sách	15/05 - 17/05						
	A2.3	Timeline	15/05 - 17/05						
GIAI ĐOẠN 2 **Sản xuất nội dung**			**Ngày**						
B1	**Lên ý tưởng**		18/05 - 08/06						
	B1.1	Brainstorm concept	18/05 - 08/06						
	B1.2	Viết kịch bản video/ bài đăng	18/05 - 08/06						
	B2.2	Demo Web truyền thông	18/05 - 20/05						
B2	**Thiết kế**		18/05 - 08/06						
	B2.1	Bài đăng Facebook	18/05 - 08/06						
	B2.2	Video	18/05 - 08/06						
	B2.2	Web truyền thông	21/05 - 26/05						

DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG OPENDAY
Thời gian triển khai dự kiến: 30 ngày

BIỂU ĐỒ GANTT

thg 5, 2025

Nhóm 8			Tuần	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6
KẾ HOẠCH DỰ ÁN									
GIAI ĐOẠN 3 **Marketing & Truyền thông**			**Ngày**						
C1	**Social media**								
	C1.1	Lập lịch đăng bài	18/05 - 01/06						
	C1.2	Tương tác, trả lời comment	18/05 - 08/06						
C2	**Seeding và chia sẻ bài đăng**								
	C2.1	Seeding	25/05 - 08/06						
	C2.2	Chia sẻ bài đăng	25/05 - 08/06						
GIAI ĐOẠN 4 **Đo lường & Báo cáo**			**Ngày**						
D1	**Báo cáo hiệu quả hàng tuần**		**25/05 - 08/06**						
	D1.1	Tổng hợp và so sánh với KPI	25/05 - 08/06						
	D1.2	Thu thập số liệu truyền thông	25/05 - 08/06						
	D1.3	Đề xuất điều chỉnh	25/05 - 01/06						
D2	**Báo cáo tổng kết chiến dịch**		**08/06 - 14/06**						
	D2.1	Tổng hợp toàn bộ dữ liệu dự án	08/06 - 14/06						
	D2.2	Phân tích hiệu quả theo mục tiêu ban đầu	08/06 - 14/06						
	D2.3	Đánh giá điểm mạnh – yếu	08/06 - 14/06						
	D2.4	Đề xuất cải thiện cho lần sau	08/06 - 14/06						

5. Kế hoạch quản lý rủi ro

Rủi ro	Ngăn chặn & giảm thiểu (RR)	Biện pháp ứng phó (BF)	Điểm kích hoạt (Trigger)
Nội dung truyền thông không thu hút **P-** **I-**	- Nghiên cứu lại insight người học - Tham khảo trend - Test A/B nội dung	- Chạy quảng cáo boost bài - Điều chỉnh content ngay	Sau 24h: reach < 50% KPI hoặc engagement < 3%
Trễ deadline thiết kế poster/vided **P-** **I-**	- Lập timeline rõ ràng - Chia task cụ thể - Check tiến độ hàng ngày	- Điều động thêm người hỗ trợ - Phân bổ lại công việc	Khối lượng công việc vượt quá khả năng, không theo kịp tiến độ
Lỗi kỹ thuật **P-** **I-**	- Kiểm tra trước khi đăng - Chuẩn hóa format file	- Gỡ bài, đăng lại nhanh - Xin lỗi nếu cần	Phát hiện lỗi sau khi đăng
Thiếu nhân lực **P-** **I-**	- Phân công backup nhân sự - Tài liệu hóa quy trình	- Phân bổ lại công việc - Thuê freelancer nếu cần	Task quan trọng nhưng thiếu người chủ chốt

Thấp Trung bình Cao Rất cao

5. Kế hoạch quản lý rủi ro

Rủi ro	Ngăn chặn & giảm thiểu (RR)	Biện pháp ứng phó (BF)	Điểm kích hoạt (Trigger)
Thông tin truyền thông sai lệch **P-** 🟢 **I-** 🔴	- Kiểm duyệt nội dung 2 lớp - Xác nhận với BTC	- Đính chính ngay trên tất cả kênh - Thông báo sửa lỗi	Có phản hồi từ người xem hoặc BTC
Tương tác tiêu cực comment xấu **P-** 🔵 **I-** 🔵	- Xây guideline phản hồi - Kiểm soát comment	- Đưa ra câu trả lời chính thức - Ẩn/xóa nếu vi phạm	Xuất hiện ≥3 comment tiêu cực trong 1 bài
Kênh truyền thông bị hạn chế **P-** 🔵 **I-** 🔵	- Đa kênh (Facebook, TikTok, IG) - Đăng giờ vàng	- Gỡ bài, đăng lại nhanh - Xin lỗi nếu cần	- Chạy ads - Chuyển hướng sang kênh khác
Không đạt số lượng tham gia mục tiêu **P-** 🔵 **I-** 🔴	- Lập KPI rõ ràng - Theo dõi hàng ngày	- Tăng ngân sách quảng cáo - Tăng tần suất đăng bài	Số đăng ký < 70% mục tiêu trước 3–5 ngày

🟢 Thấp 🔵 Trung bình 🟠 Cao 🔴 Rất cao



3. TRIỂN KHAI DỰ ÁN

1. Tổng quan quá trình triển khai

- **Thời gian triển khai dự án:** Chiến dịch được thực hiện trong 7 tuần, từ 10/05/2026 đến 22/06/2026.
- **Tiến độ thực tế so với kế hoạch:** Dự án hoàn thành muộn hơn kế hoạch 8 ngày (so với mốc 14/06/2026) do chậm trễ trong việc thiết lập Fanpage Facebook và ảnh hưởng từ lịch học, thi cử của các thành viên.



- **Biện pháp khắc phục:** Điều phối nhân lực hợp lý và đẩy nhanh tiến độ ở giai đoạn cuối, đảm bảo hoàn thành đầy đủ các hạng mục và yêu cầu chất lượng.
- **Mục tiêu trọng tâm:** Tập trung vào truyền thông tạo nhận diện và thu thập dữ liệu đăng ký trước sự kiện OpenDay 2026 (diễn ra ngày 19/07/2026).
- **Sản phẩm bàn giao:** Website tích hợp Chatbot tư vấn, hệ thống kênh truyền thông đa nền tảng được chuẩn hóa và cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký sự kiện.

Kế hoạch chi tiết tiến độ dự án điều chỉnh

Nhóm 8			Tuần	1	2	3	4	5	6	7
KẾ HOẠCH DỰ ÁN										
GIAI ĐOẠN 1 Nghiên cứu và lập kế hoạch			**Ngày**							
A1	**Báo cáo phân tích thị trường & đối tượng**		**10/05 – 14/05**							
	A1.1	Phân tích thị trường	10/05 - 14/5							
	A1.2	Phân tích đối tượng	10/05 - 14/5							
A2	**Kế hoạch tổng thể chiến dịch**		**15/05 – 17/05**							
	A2.1	Nhân sự	15/05 - 17/05							
	A2.2	Ngân sách	15/05 - 17/05							
	A2.3	Timeline	15/05 - 17/05							
GIAI ĐOẠN 2 Sản xuất nội dung			**Ngày**							
B1	**Lên ý tưởng**		**18/05 - 20/05**							
	B1.1	Brainstorm concept	18/05 - 08/06							
	B1.2	Viết kịch bản video/ bài	18/05 - 08/06							
	B2.2	Demo Web truyền	18/05 - 20/05							
B2	**Thiết kế**		**18/05 - 19/06**							
	B2.1	Bài đăng Facebook	18/05 - 19/06							
	B2.2	Video	18/05 - 19/06							
	B2.2	Web truyền thông	18/05 - 19/06							

			Tuần	1	2	3	4	5	6	7
KẾ HOẠCH DỰ ÁN										
GIAI ĐOẠN 3 Marketing & Truyền thông			**Ngày**							
C1	**Social media**		**18/05 - 19/06**							
	C1.1	Lập lịch đăng bài	18/05 - 19/06							
	C1.2	Tương tác, trả lời comment	18/05 - 19/06							
C2	**Seeding và chia sẻ bài đăng**		**25/05 - 19/06**							
	C2.1	Seeding	25/05 - 19/06							
	C2.2	Chia sẻ bài đăng	25/05 - 19/06							
GIAI ĐOẠN 4 Đo lường & Báo cáo			**Ngày**							
D1	**Báo cáo hiệu quả hàng tuần**		**25/05 - 20/06**							
	D1.1	Tổng hợp và so sánh với	25/05 - 20/06							
	D1.2	Thu thập số liệu truyền	25/05 - 20/06							
	D1.3	Đề xuất điều chỉnh	25/05 - 20/06							
D2	**Báo cáo tổng kết chiến dịch**		**16/06 - 21/06**							
	D2.1	Tổng hợp toàn bộ dữ liệu	16/06 - 21/06							
	D2.2	Phân tích hiệu quả theo	16/06 - 21/06							
	D2.3	Đánh giá điểm mạnh –	16/06 - 21/06							
	D2.4	Đề xuất cải thiện cho lần	16/06 - 21/06							

2. Triển khai hoạt động trên nền tảng Facebook



Mục tiêu

Facebook là kênh truyền thông chính, tập trung cung cấp thông tin và thu hút công chúng:

- Tăng nhận diện thương hiệu cho sự kiện OpenDay ngành Công nghệ Giáo dục trên mạng xã hội.
- Tiếp cận và tương tác với học sinh THPT, phụ huynh; thúc đẩy đăng ký tham gia sự kiện ngày 19/07/2026.



Hoạt động triển khai thực tế

- Xây dựng và vận hành lịch đăng bài (Content Calendar) khoa học trên Fanpage, tập trung vào các khung giờ có lượng học sinh THPT hoạt động cao.
- Phân bổ hợp lý giữa bài viết cung cấp thông tin và bài viết kêu gọi đăng ký nhằm duy trì tương tác ổn định.



3. Triển khai hoạt động trên nền tảng TikTok



Mục tiêu

Kênh truyền thông tiktok trọng tâm để tiếp cận học sinh THPT và gia tăng nhận diện ngành CNGD.


- Qua các video ngắn, trực quan và hấp dẫn, giúp giới thiệu ngành học gần gũi, gợi sự quan tâm của học sinh.
- Điều hướng người xem truy cập Website hoặc đăng ký tham gia sự kiện OpenDay ngày 19/07/2026.



Hoạt động triển khai thực tế

Từ 10/05 đến 19/06/2026, triển khai sản xuất và đăng tải video TikTok ngắn:

- Sử dụng âm thanh xu hướng và hiệu ứng phù hợp để thu hút học sinh THPT.
- Gắn hashtag chiến dịch và kêu gọi người xem truy cập Facebook, Website,... góp phần tăng nhận diện và hiệu quả truyền thông.

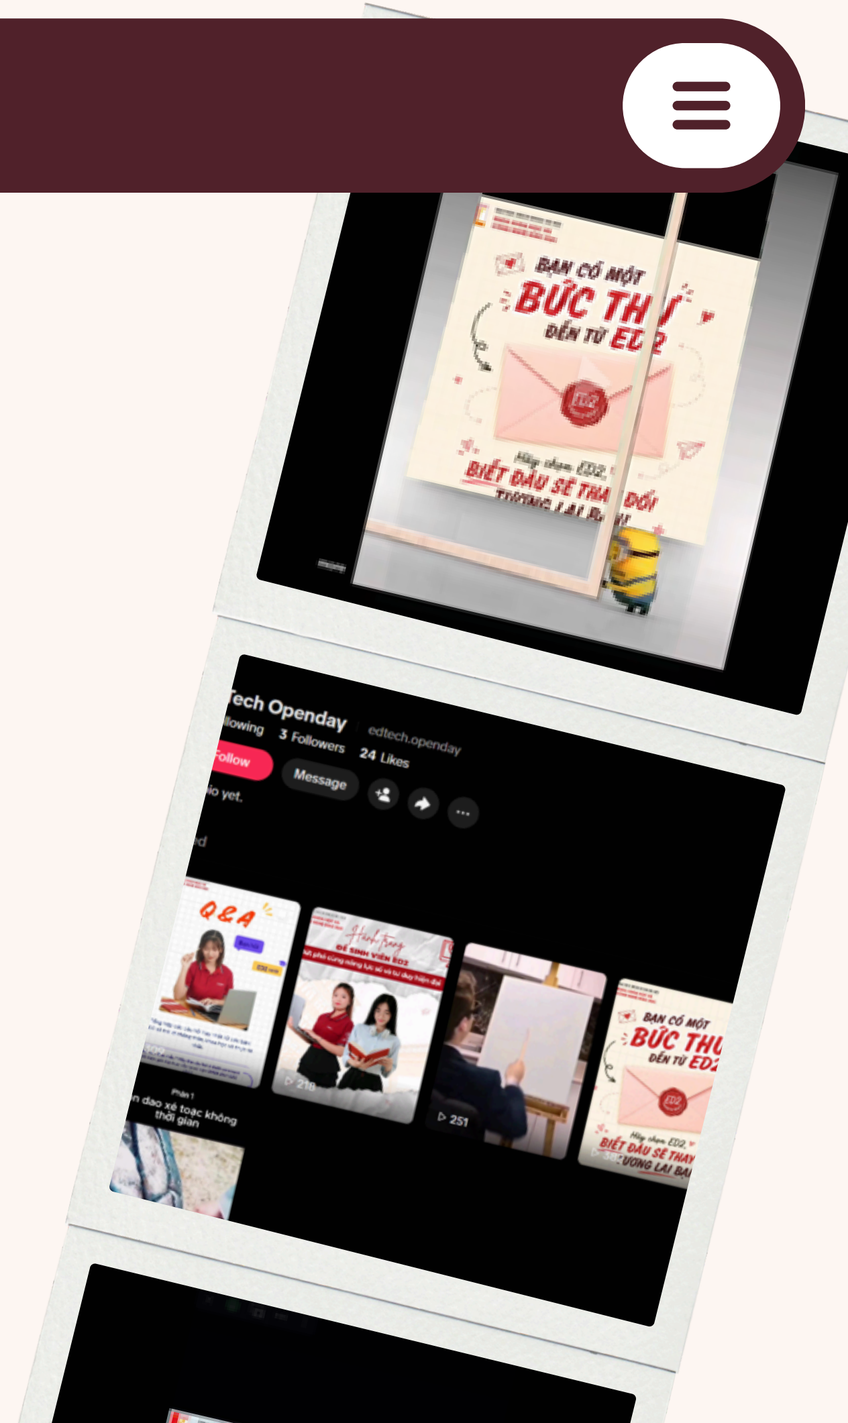

4. Triển khai xây dựng Website



Chức năng của hệ thống Website

Cổng thông tin trung tâm, lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu chính thống và điều hướng hành vi quyết định.

- Cung cấp cái nhìn toàn diện về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội nghề nghiệp
- Hiển thị dòng thời gian triển khai chi tiết (Timeline) sự kiện Openday 2026
- Tích hợp chatbot hỗ trợ giải đáp thắc 24/7



Hoạt động triển khai thực tế

- Xây dựng sơ đồ website (sitemap) và thiết kế giao diện mẫu (wireframe).
- Tổng hợp nội dung, hình ảnh cho chuyên mục thông tin.
- Tiến hành xây dựng website chính thức.
- Phát triển tính năng tăng trải nghiệm người dùng (chatbot, chủ đề giao diện sáng tối,..)





4. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ

1. Theo dõi tiến độ thực hiện



TIẾN ĐỘ

- Giai đoạn đầu bị chậm do phân quyền Fanpage trễ và trùng lịch thi, gây chậm chuỗi sản xuất nội dung và website.
- Sau đó áp dụng quản lý cuốn chiếu, tăng cường làm việc ở Tuần 4–5 và đưa dự án về đúng tiến độ, hoàn thành 100% WBS trước 19/06/2026.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Duy trì họp tuần định kỳ để tổng kết công việc, xây dựng kế hoạch tuần mới
- Ghi nhận biên bản đầy đủ nhằm đảm bảo kiểm soát và điều phối hiệu quả.

2. Những thay đổi trong dự án

STT	Vấn đề phát sinh	Nguyên nhân gốc rễ	Tác động đến sự án
1	Chậm trễ khởi tạo và phân quyền quản trị Fanpage Facebook	Chậm trễ khởi tạo và phân quyền quản trị Fanpage Facebook	Lùi lịch phát hành tuyến nội dung
2	Tồn đọng tiến độ phê duyệt kịch bản và sản xuất hậu kỳ video ngắn	Thành viên vướng lịch thi học kỳ và các bài kiểm tra chuyên ngành dày đặc tại Đại học Bách khoa Hà Nội	Gây áp lực nén thời gian lên các giai đoạn truyền thông kế tiếp.
3	Tiến độ lập trình giao diện thô và hoàn thiện kỹ thuật Website bị kéo dài	Nhân sự nội bộ thiếu hụt kỹ năng chuyên sâu về tối ưu giao diện tương thích (Responsive UI/UX)	Kéo dài thời gian kiểm thử kỹ thuật
4	Tính năng trải nghiệm không gian ảo VR360 bị mờ, nhiễu hạt cục bộ	Thiếu hụt thiết bị chuyên dụng; các phần mềm xử lý miễn phí bị giới hạn nghiêm ngặt về chất lượng xuất ảnh	Sản phẩm đầu ra tại phân hệ VR360 chưa đạt độ sắc nét lý tưởng như kế hoạch

3. Các biện pháp điều chỉnh

STT	Sự cố ghi nhận	Biện pháp can thiệp	Cơ chế điều phối nguồn lực
1	Trễ hạn sản xuất video và lập trình thô Website do thành viên bận lịch thi	Tăng cường nhân sự hỗ trợ chéo. Áp dụng quy trình sản xuất cuốn chiếu (content - Desgin - Code chạy song song)	Điều chuyển thành viên nhóm sang hỗ trợ nhóm kỹ thuật nhập liệu và dịch kịch bản
2	Phân hệ VR360 bị lỗi hiển thị, hình ảnh mờ nhiễu do giới hạn phần mềm miễn phí	Triển khai thử nghiệm, căn chỉnh và xuất ảnh nhiều lần dưới các thuật toán nén khác nhau. Chấp nhận lỗi để giữ tiến độ.	Tập trung tối ưu hóa thủ công trong phạm vi cho phép; Trưởng dự án lập hồ sơ kiến nghị cho các dự án sau kế thừa
3	Chỉ số tương tác Facebook tuần đầu bị chững; tiến độ thu thập biểu mẫu Form đăng ký chậm	Các thành viên trong nhóm dự án tích cự seeding, chia sẻ bài đăng	Trưởng dự án đốc thúc và lập KPI tương tác cho các thành viên trong nhóm dự án



5. TỔNG KẾT DỰ ÁN

1. Tổng kết kết quả dự án



+1K

Người theo dõi Fanpage Facebook

24

Bài viết, ấn phẩm được xuất bản

05


Video ngắn điều hướng Tiktok

W

Website hỗ trợ tư vấn

Kết quả

	Timestamp	Họ và tên	Email	Số điện thoại	Đối tượng	Trường/Đơn vị	Chủ đề quan tâm	Nguồn thông tin	Ghi chú
2	03/06/2026 14:49:59	thao	b1uekuns2@gmail.com	21211321	student		AI trong giáo dục		
3	03/06/2026 14:55:49	thao	b1uekuns2@gmail.com	9123123	student		Thiết kế bài giảng số		
4	03/06/2026 15:24:02	Thao	b1uekuns2@gmail.com	34328423	student		AI trong giáo dục		
5	05/06/2026 11:57:59	sư	b1uekuns2@gmail.com	863354543	student		Thiết kế bài giảng số		
6	10/06/2026 13:50:01	Dang Tien Nam	dangnam@gmail.com	213213123	student		AI trong giáo dục		
7	15/06/2026 13:50:26	Hai Tu	haitu@gmail.com	912313231	student		Thiết kế bài giảng số		
8	16/06/2026 13:50:51	Son Dang	sondang@gmail.com	9231231231	student		AI trong giáo dục		
9	16/06/2026 13:51:20	Nghiep Lam	nghieplam@gmail.com	9213123123	business		ARVR		
10	17/06/2026 13:51:57	Hoang Can	hoangcan@gmail.com	9213123123	teacher		AI trong giáo dục		
11	18/06/2026 13:52:33	Thanh Thao	thao@gmail.com	9123214142	student		Thiết kế bài giảng số		
12	19/06/2026 13:53:00	Tu Trinh	tutrinh@gmail.com	9231231212	student		AI trong giáo dục		
13	20/06/2026 13:53:22	Đăng Quang	dangquang@gmail.com	23123123123	student		ARVR		
14	21/06/2026 13:53:45	Quang Thự	quangthu@gmail.com	9231453124	student		AI trong giáo dục		
15	22/06/2026 13:54:11	Quang Long	quanglong1@gmail.com	9324314533	student		Thiết kế bài giảng số		
16	23/06/2026 13:56:17	Kim Tuyen	kimtuyen@gmail.com	9353252343	student	HUST	ARVR	website	

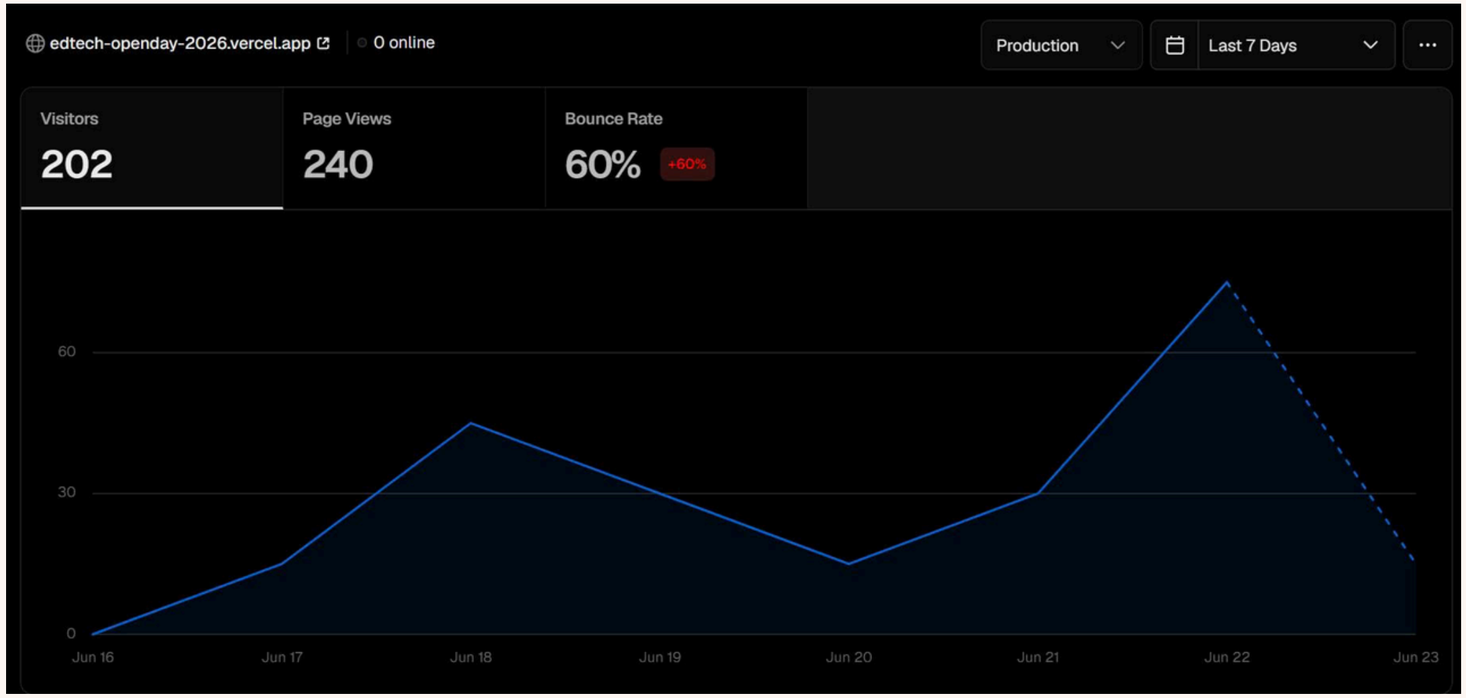

16 lượt đăng ký trong Tháng 6/2026



2. Điểm thực hiện tốt

1 Quản trị nhân sự và cơ chế phối hợp linh hoạt

Điểm nổi bật trong công tác quản trị là xây dựng sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm rõ ràng ngay từ đầu, giúp tránh chồng chéo công việc.



2 Tính đồng bộ truyền thông và hiệu quả hạ tầng công nghệ

Thiết kế hệ sinh thái tích hợp đa nền tản với hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ trên Facebook, TikTok và Website và tích hợp AI nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp





4 Tư duy định hướng dữ liệu trong tối ưu hóa chuyển đổi

Điểm nổi bật trong công tác quản trị là xây dựng sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm rõ ràng ngay từ đầu, giúp tránh chồng chéo công việc.

2. Điểm thực hiện tốt

1 Quản trị nhân sự và cơ chế phối hợp linh hoạt

Điểm nổi bật trong công tác quản trị là xây dựng sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm rõ ràng ngay từ đầu, giúp tránh chồng chéo công việc.

2 Tính đồng bộ truyền thông và hiệu quả hạ tầng công nghệ

Thiết kế hệ sinh thái tích hợp đa nền tản với hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ trên Facebook, TikTok và Website và tích hợp AI nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp

3 Khả năng chủ động quản trị và kiểm soát rủi ro hệ thống

Hệ thống kiểm soát rủi ro chủ động nhờ xây dựng ma trận nhận diện nguy cơ ngay từ đầu, giúp nhóm ứng phó kịp thời với các sự cố.







2. Điểm thực hiện tốt

2 Tính đồng bộ truyền thông và hiệu quả hạ tầng công nghệ

Thiết kế hệ sinh thái tích hợp đa nền tản với hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ trên Facebook, TikTok và Website và tích hợp AI nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp



3 Khả năng chủ động quản trị và kiểm soát rủi ro hệ thống

Hệ thống kiểm soát rủi ro chủ động nhờ xây dựng ma trận nhận diện nguy cơ ngay từ đầu, giúp nhóm ứng phó kịp thời với các sự cố.



4 Tư duy định hướng dữ liệu trong tối ưu hóa chuyển đổi

Chiến dịch vận hành theo tư duy data-driven, liên tục tối ưu nội dung và quảng cáo dựa trên phân tích dữ liệu, qua đó đạt 285 đơn đăng ký chất lượng cao cho OpenDay.



2. Điểm thực hiện tốt

3 Khả năng chủ động quản trị và kiểm soát rủi ro hệ thống

Hệ thống kiểm soát rủi ro chủ động nhờ xây dựng ma trận nhận diện nguy cơ ngay từ đầu, giúp nhóm ứng phó kịp thời với các sự cố.

4 Tư duy định hướng dữ liệu trong tối ưu hóa chuyển đổi

Chiến dịch vận hành theo tư duy data-driven, liên tục tối ưu nội dung và quảng cáo dựa trên phân tích dữ liệu, qua đó đạt 285 đơn đăng ký chất lượng cao cho OpenDay.

1 Quản trị nhân sự và cơ chế phối hợp linh hoạt

Điểm nổi bật trong công tác quản trị là xây dựng sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm rõ ràng ngay từ đầu, giúp tránh chồng chéo công việc.



3. Những hạn chế của dự án

Hạn chế về nguồn lực tài chính và rào cản công nghệ hỗ trợ

- Chiến dịch bị hạn chế về quy mô do ngân sách sinh viên, đặc biệt ảnh hưởng đến quảng cáo trả phí và chất lượng phân hệ VR360 trên website.



Quỹ thời gian ngắn và sự thiếu hụt độ phủ đa kênh

- Chiến dịch bị giới hạn 6 tuần và dự trù 1 tuần, đồng thời hạn chế về mặt nhân sự, chỉ triển khai trên Facebook và TikTok nên chưa mở rộng được sang các kênh như Instagram và YouTube.



3. Những hạn chế của dự án

Hạn chế về nguồn lực tài chính và rào cản công nghệ hỗ trợ

- Chiến dịch bị hạn chế về quy mô do ngân sách sinh viên, đặc biệt ảnh hưởng đến quảng cáo trả phí và chất lượng phân hệ VR360 trên website.

Quỹ thời gian ngắn và sự thiếu hụt độ phủ đa kênh

- Chiến dịch bị giới hạn 6 tuần và dự trù 1 tuần, đồng thời hạn chế về mặt nhân sự, chỉ triển khai trên Facebook và TikTok nên chưa mở rộng được sang các kênh như Instagram và YouTube.




4. Bài học kinh nghiệm

1

Bài học về công tác lập kế hoạch và dự trù rủi ro

2

Bài học về quản lý nhóm và điều phối nguồn lực

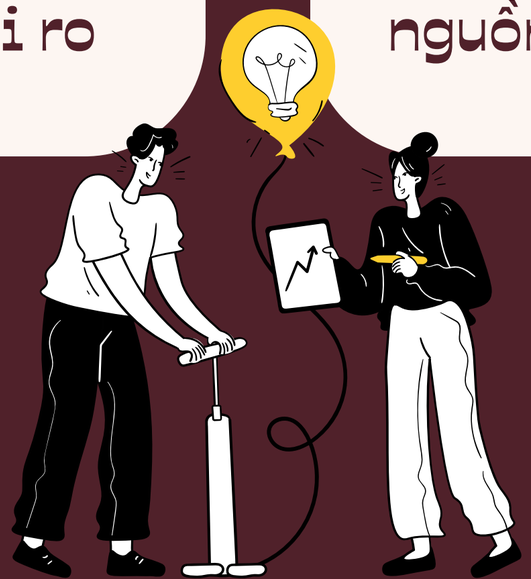

2

Bài học về tư duy truyền thông tích hợp và điều hướng

4

Bài học về ứng dụng công nghệ tự động hóa
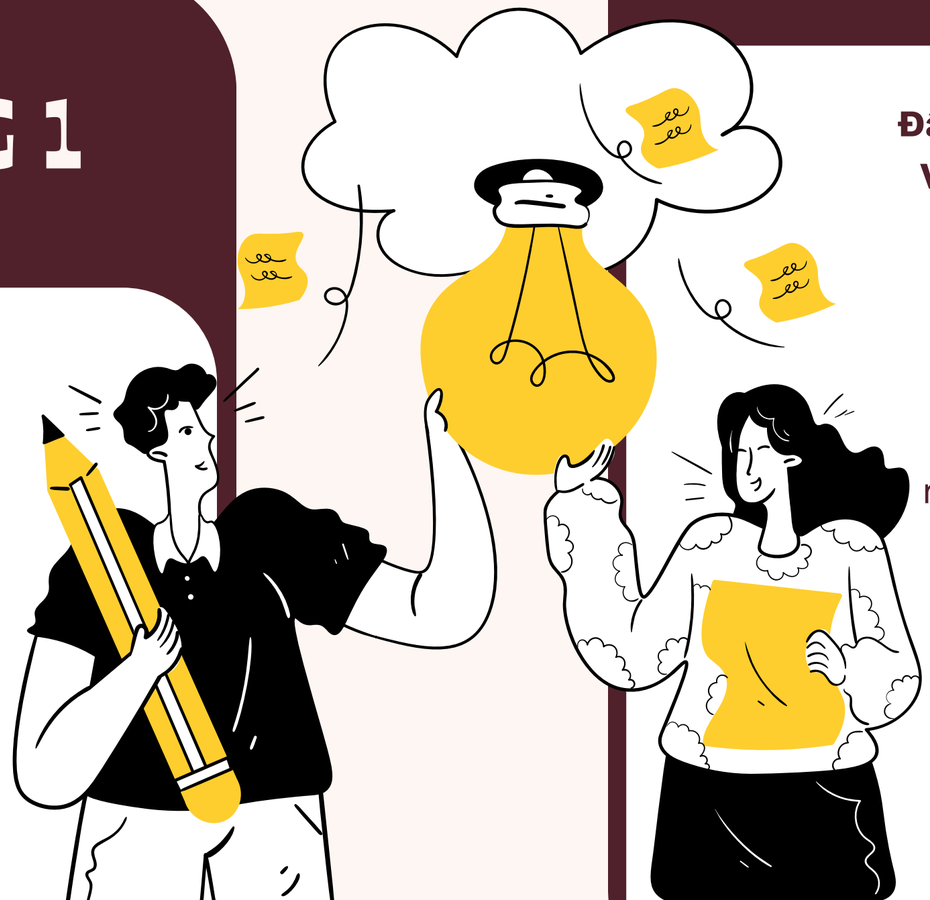


5. Định hướng

ĐỊNH HƯỚNG 1

Kế thừa hạ tầng và nâng cấp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot)

- Đề xuất tái sử dụng mã nguồn website và nâng cấp chatbot từ FAQ cố định lên AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để cá nhân hóa tư vấn tuyển sinh.



ĐỊNH HƯỚNG 2

Đầu tư chuyên sâu phân hệ VR360 và mở rộng hệ sinh thái đa kênh

Đề xuất cung cấp ngân sách để thuê các thiết bị chuyên dụng hoặc nên nền tảng thiết kế riêng VR Tour 360. Mở rộng truyền thông sang Instagram, YouTube Reels nhằm nâng cấp trải nghiệm và tối ưu chiến lược tuyển sinh dài hạn.

Cám ơn đã theo dõi

